



Avancement des travaux

Aile Moreau

Dans le cadre de la réalisation des terrassements dans l'aile Moreau et de la galerie technique Moreau ce sont 50 m³ de terre qui sont extraits et transportés par un camion aspirateur bâché.

L'opération est répétée 5 fois par jour ! Cette phase s'achèvera en juillet 2024 par la création de la galerie technique.



Rue Manin

À l'emplacement de l'ancien parking motos les travaux de terrassement et maçonnerie de l'enceinte du **Groupe Electrogène (GE) provisoire** sont terminés.

Le futur GE sera installé fin juillet et n'engendrera pas de nuisances sonores particulières.



Des essais mensuels d'1h seront réalisés tôt le matin; un Everyone informant des dates des essais sera systématiquement envoyé.

Chiffres clés au 20/07/2023



46 mois de travaux



Horaires de chantier :
De 08h00 à 20h00
Du lundi au vendredi



10-15 personnes
(Effectif moyen)



Environ 3%
(Avancement au
15/07/2023)

Cour Manin

Au niveau de l'entrée des Urgences, sont en cours les travaux de fondations de la **future plateforme des Fluides Médicaux**. La découverte de fondations déjà existantes nécessite de déterminer une solution de fondation alternative, actuellement en réflexion avec les bureaux d'études.



Cour Moreau

Depuis fin juin, les terrassements et le blindage ont lieu cour Moreau afin de créer la future **galerie technique**.



Travaux à venir

Tour incendie

La création de **la tour incendie** (escalier) qui sera accolée au Nouveau Bâtiment (NB), au niveau de l'entrée des Urgences, s'achèvera début novembre. le grutage de la charpente de la tour incendie se fera du 4 au 15 septembre

Les premières interventions ont lieu au sous-sol en **Imagerie**, engendrant le confinement de 2 zones pour la réalisation des dévoiements de réseaux nécessaires à cette opération.



Future tour incendie
Accès Pompiers

Organisation du grutage

Le temps de grutage pour la mise en place de la tour incendie et des groupes froids sera quotidiennement limité, entre 8h et 20h. Aussi, la grue sera-t-elle repliée les soir et weekend.




Durant les horaires de fonctionnement de la grue, l'accès aux Urgences se fera par le 27 rue Manin.

Groupes froids

L'installation des **groupes froids** en terrasse (+7) du Nouveau Bâtiment (NB) aura lieu en deux temps :
Du 7 au 15 août : Grutage de la charpente métallique et des équipements
Du 16 au 18 août : Grutage des Groupes Froids

L'espace fumeurs sera quant à lui transféré à l'entrée du personnel, 56 avenue Mathurin Moreau, pendant les heures de grutage.

Le parvis de l'Hôpital servira d'espace fumeurs pour les patients sur ces mêmes zones horaires.



Suppression des passerelles

Suite à l'installation de la tour incendie, les deux passerelles reliant l'Ancien Bâtiment (AB) au Nouveau Bâtiment (NB) seront neutralisées (fermées), fin août puis démolies.

Nous communiquerons les dates précises dès que celles-ci auront été transmises par la société Spie Batignolles.

De nouveaux flux patients et personnels liés à ces travaux et réorganisant les déplacements seront mis en place.

Cette phase de travaux pourra générer des nuisances sonores et vibratoires.



Suppression de la galerie du bloc


A partir du 21 août, la galerie extérieure des blocs sera fermée puis démolie engendrant la fermeture successive des blocs 16 et 17 puis 1 et 6.

Blocs 16 et 17 : du 14 août au 5 novembre 2023

Blocs 1 et 6 : du 6 novembre au 10 décembre 2023

Cette phase de travaux pourra générer des nuisances sonores et vibratoires.

PLANNING CHANTIER

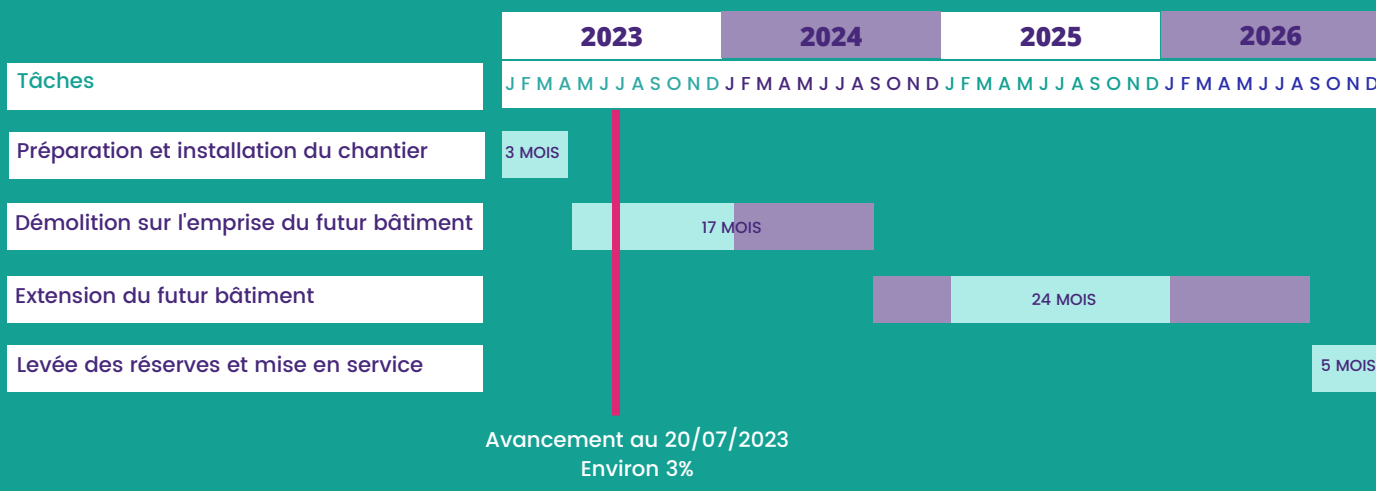

Circulation



La séparation des flux piétons et flux engins assure la sécurité de la circulation. Une signalisation spécifique a été mise en place afin de renforcer la sécurisation les différentes zones.



Les zones de chargement/déchargement sont dédiées à ces seules activités.



Les manœuvres des camions sont guidés par un homme-traffic formé et identifié, dédié à la circulation.

